质安部主办

# 发展建设

# 安全简报

（2017 年 第九期）

为加强现场安全管理，保持公司安全生产稳步推进，质安部努力确保“四个到位”即确保思想认识到位，项目经理履职到位，安全投入到位，宣传培训到位。

## 一、各工地班前会情况

汪杜路外立面改造工程班前会

汪杜路外立面改造工程班前会

天上街市工程班前会

天上街市工程班前会

城中村改造项目观音岩

城中村班前会

城中村改造项目观音岩

城中村班前会

明月污水处理厂

班前会

明月污水处理厂

班前会

金辉国际酒店

班前会

金辉国际酒店

班前会

城中村改造项目章广二期

城中村班前会

城中村改造项目章广二期

城中村班前会

城中村改造项目章广二期
城中村班前会

城中村改造项目章广二期
城中村班前会

## 二、检查总体情况

本月质安部对公司所有在建项目进行了安全生产检查，检查中发现多个项目现场比较混乱，材料堆码无序。特别是明月污水处理厂项目，模板随意丢弃，部分工人未戴安全帽，高空作业时未系安全绳，跳板随意搭设，钢筋随意摆放，配电箱未上锁。天上街市项目临时用电存在安全隐患，配电箱未上锁，不用的配电箱要及时拆除，同时必须确保临时用电的绝缘保护，避免出现触电事故。

# 三、具体问题

| 项目名称 | 项目负责人 | 存在问题 |
| --- | --- | --- |
| 汪杜路外立面改造工程 | 唐敦洪 | 1. 材料堆放无序。<br>2. 安全密布网破损。 |

材料堆放无序

安全密布网破损

| | | |
| --- | --- | --- |
| 天上街市 | 杨金鑫 | 1. 未使用的配电箱未关闭未拆除。<br>2.高空作业未戴安全绳。 |

未使用的配电箱未关闭未拆除。

董事长及质安部检查工地

蓥城西区城中村改造项目
观音岩城中村　　吴刚　　1. 配电箱未按要求关闭上锁。

质安部检查施工现场

配电箱未按要求关闭上锁

蓥城西区城中村改造项目
章广二期城中村　　唐爽　　1. 配电箱未按要求关闭上锁。

配电箱未按要求关闭上锁

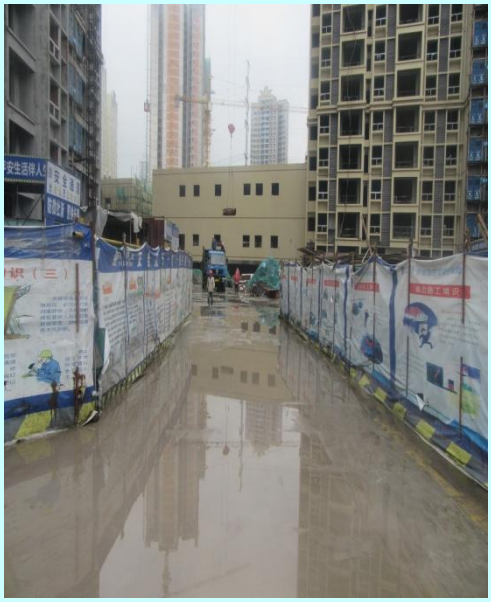

质安部检查施工现场

| | | |
|---|---|---|
| 明月污水处理厂 | 唐爽 | 1.工人未佩戴安全帽。<br>2.配电箱未按要求关闭上锁。 |

工人未佩戴安全帽

配电箱未按要求关闭上锁

## 四、整改措施及处罚情况

本次检查对天上街市项目、明月污水处理厂、章广二期城中村、观音岩城中村下发了整改通知单并限期整改完毕。

对明月污水处理厂蒋显华班组，因多名工人未佩戴安全帽，高空作业未戴安全绳，施工现场极其混乱。对蒋显华班组处以1000元的罚款。

对天上街市项目部，因高空作业人员未系安全带且未佩戴安全帽，对项目经理杨金鑫处以200元的罚款，对管理人员何昊、段成鑫各处以100元罚款。

## 五、工作要求

### 1. 冬季施工安全注意事项

为了做好在建工地冬季施工安全生产工作，确保职工人身安全最大限度地避免安全事故的发生。切实好以下几项工作：

①. 消防安全工作：寒冷季节到来，禁止明火取暖，施工动火必须经过审批，施工前请管好场地，隔断火源。临时用电要按规范搭设，严禁私拉乱接。用电设备严格按照“一机一闸一箱一漏”的要求安装。切割机做好火星屏蔽，随时清理杂物，以免发生火灾。

②.施工安全工作：施工现场设置危险源公示牌，告知地点、危害性、防范措施。对有脚手架的项目进行普遍检查，钢管扣件、连墙件、钢丝绳等连接件是否牢固，有无损坏。设置好安全通道，做好各种洞口、井口及临边防护，警示标语醒目。

### 2. 加强冬季安全教育

各项目部每天必须组织召开班前会议，对当天施工内容所需的注意事项加以强调。新工人入场前必须做好三级安全教育，施工现场上安全帽必须正确佩戴，有高空作业的项目必须佩戴好安全绳，并确保有管理人员在场。冬季安全事故多发，不安全因素较为普遍，必须高度重视安全工作，加强对现场的安全管理。
